



# Dynamique Paysanne Féminine (DPF)

Tél. : +243 825 403 009 ; +234 993 855 552 | E-mail : [fem.dyna@yahoo.fr](mailto:fem.dyna@yahoo.fr),

[info@dpf-developpement.org](mailto:info@dpf-developpement.org) Web: <https://dpf-developpement.org/> | Facebook et Twitter: [@ONGDPF](#)

## RAPPORT FINAL

Appui d'urgence aux moyens de subsistance agricoles des ménages touchés par le conflit dans l'est de la RDC



### TCP/DRC/4003

« Sensibilisation, Ciblage des bénéficiaires, Distribution d'intrants agricoles et encadrement technique de 5400 ménages vulnérables et collecte des informations sur l'agriculture et la sécurité alimentaire dans la Zone de santé de Kirotche et Minova »

**Territoire de Masisi et Kalehe**

*Bailleur des fonds* : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

*Partenaire de Mise en œuvre* : Dynamique Paysanne Féminine (DPF-ONG)

Tél. : +243 998 186 005

E-mail : [fem.dyna@yahoo.fr](mailto:fem.dyna@yahoo.fr)

**Goma**

**Février 2026**



Projet d'appui d'urgence aux moyens de subsistance agricoles des ménages touchés par le conflit dans l'est de la RDC. TCP/DRC/4003

Coordination : n°04, Av. du commerce, Q. Murara, Ville de Goma, RD Congo  
Siège social : Nyabibale, village Bweremana, Masisi, RDC.

N° et Intitulé du P.A	<b>PROTOCOLE D'ACCORD N°0146-2025 -DPF</b> Facilitation du processus de ciblage de ménages, Distribution d'intrants agricoles, accompagnement technique de 5400 ménages vulnérables et collecte des informations sur l'agriculture et la sécurité alimentaire dans la zone de santé de Kirotshe au Nord-Kivu, et la zone de santé de Minova au Sud-Kivu
Titre du projet	Appui d'urgence aux moyens de subsistance agricoles des ménages touchés par le conflit dans l'est de la RDC <b>TCP/DRC/4003</b>
Durée	9 mois
Période de démarrage	16 Juin 2025
Zones d'intervention	Zone de santé de Kirotshe et Z.S de Minova
Territoires	Masisi et Kalehe
Provinces	Nord et Sud-Kivu
Nombre des bénéficiaires ciblés	5400 ménages retournés, déplacés internes, familles d'accueil



## I. RESUME

Ce rapport présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités de Sensibilisation, Ciblage des bénéficiaires, Distribution d'intrants agricoles et encadrement technique de 5400 ménages vulnérables et collecte des informations sur l'agriculture et la sécurité alimentaire dans la Zone de santé de Kiroteche, et Minova ; confiées à l'ONG Dynamique Paysanne Féminine suivant le Protocole d'accord N°0146-2025 signé avec la FAO dans le cadre du projet « Appui d'urgence aux moyens de subsistance agricoles des ménages touchés par le conflit dans l'est de la RDC », financé par la FAO pour une durée de 9 mois.

D'une globale, dans ces deux zones de santé le projet cible 5400 ménages-bénéficiaires localisés dans les aires de santé de Kimoka, Kihindo, Shasha, Territoire de Masisi au Nord-Kivu, et Cheya, Kiniezire, Mukwija, Ruhunde, et Nyamasasa au Sud-Kivu.

Aux termes du Protocole d'accord signé entre la FAO et la DPF, cette dernière a la responsabilité d'apporter une assistance en sécurité alimentaire aux retournés, déplacés internes et familles d'accueil à travers les activités d'appui à la relance agricole d'urgence, mais aussi la collecte des données sur l'agriculture et la sécuritaire alimentaire.

A cette phase de clôture du projet, toutes les activités prévues ont été réalisées dans les 2 zones de santé, entre autres : a) Etablissement des critères de ciblage en étroite collaboration avec la FAO, le cluster sécurité alimentaire et les membres de communautés bénéficiaires ; b) Sensibilisation des communautés bénéficiaires sur le projet et processus de ciblage ; c) Organisation des séances de sensibilisation et validation des critères de vulnérabilités au sein de communautés à travers les assemblées villageoises, d) Mise en place des comités de ciblage au sein de la communauté ; e) Information et sensibilisation des communautés sur le projet et les mécanismes de plaintes ; f) collecte et enregistrement de données (qualitative et quantités) de ménages identifiés, répondant aux critères de vulnérabilité, en étroite collaboration avec les cellules d'animation communautaire, g) affichage des listes des bénéficiaires ; h) Mise à jour de la base de données ; i) Sensibilisation des ménages et préparation des sites de distribution des semences ; j) Distribution de kit maraicher à 2200 ménages ; k) Renforcement des connaissances des bénéficiaires sur le maraichage en mettant l'accent sur le micro-jardinage et l'agriculture sensible à la nutrition ; l) Suivi et encadrement technique des ménages bénéficiaires ; m) Collecte des données sur la production des ménages et son utilisation ; n) Assurer la visibilité de la FAO sur terrain.

## II. GENERALITE

### II.1. Contexte Générale du projet

Le contexte humanitaire au Nord comme au Sud Kivu est grave, marqué par des affrontements armés entre les FARDC et des groupes armés comme le M23, entraînant des déplacements massifs de population et des difficultés d'accès aux services sociaux de base. Des milliers de personnes sont déplacées, manquant de vivres, d'eau potable et de services sanitaires.

Néanmoins depuis le mois de Janvier 2025, de nombreux ménages avaient été forcés de retourner dans leurs localités d'origine après observation d'une accalmie et le démentiellement



des camps des déplacés dans la ville de Goma et ses environs. Fort malheureusement la majorité de cette population fait face à des défis majeurs pour leur réintégration. La situation sécuritaire reste volatile, et les retournés rencontrent des difficultés d'accès à leurs terres, à la nourriture et aux moyens de subsistance. Des projets de relèvement communautaire et d'aide humanitaire sont en cours pour soutenir ces populations, parmi lesquels celui de la FAO qui s'inscrit dans le secteur de sécurité alimentaire et appui aux moyens d'existence.

Pour une mise en œuvre efficace et efficiente, la FAO a jugé utile de travailler avec la DPF pour l'implémentation de toutes les composantes du projet (Ciblage, Encadrement technique, distribution des kits agricoles ainsi que la collecte des données) ceci comme stratégie d'appui aux moyens d'existence, c'est ainsi qu'un protocole d'accord a été signé.

## II.2. Objectifs du projet

D'une manière générale, l'objectif de projet est de contribuer à préserver les moyens de subsistance ruraux, augmenter rapidement l'accès à la nourriture et améliorer la nutrition de communautés à travers des interventions tenant compte de la nutrition et améliorant l'accès à des aliments riches en nutriments.

## II.3. Méthodologie de mise en œuvre

Pour arriver à réaliser les activités dans le temps prévu et atteindre les objectifs poursuivis d'une manière efficace, efficiente et pérenne. Nous avons fait recours à plusieurs les stratégies de mise en œuvre constituant ainsi la méthodologie d'exécution de ce projet. En qualité d'exécutant tel que nous l'assigné dans le protocole d'accord, pour arriver à terme de ce projet nous avons jugé utile de :

- ✚ Travailler en étroite collaboration avec les autorités et leaders locaux à tous les niveaux ;
- ✚ Travailler avec la population locale en recrutant localement les agents terrain qui seront d'une manière permanente en contact avec la population (bénéficiaires) ;
- ✚ Travailler en collaboration avec l'inspection territoriale d'agriculture à travers le service d'agriculture de la chefferie, lui qui fait le suivi permanent des activités agricole sur terrain.
- ✚ Travailler dans le strict respect de notre plan de travail pour faciliter l'atteinte des résultats escomptés d'ici Février 2026 tel que prévu par le PdA.
- ✚ Vu que le projet couvre un site très vaste, nous avons constitué une équipe terrain dynamique et expérimentée ;
- ✚ Les activités étant nombreuses, il y a certaines activités qui seront exécutées concomitamment sous forme de paquet d'activité bien qu'avec des objectifs spécifiques différents ;
- ✚ Nous allons utiliser les outils de sensibilisation et d'encadrement (guide du sensibilisateur, module de formation sur les cultures maraichères) déjà approuvés par la FAO dans d'autres projets similaires et dans le cas échéant les réactualiser ;
- ✚ Des séances de formation, préparation des encadreurs et mobilisateurs sur les différentes thématiques seront tenues pour une meilleure compréhension et reproduction sur terrain ;
- ✚ Les sensibilisations vont se tenir d'une manière continue durant toute la période de mise en œuvre des activités, d'une manière stratégique pour que nous nous assurons que le message a été bien compris et appliqué par un minimum de 70% des bénéficiaires.

- ✚ Chaque groupe sera encadré et suivi par un moniteur, sous la supervision directe d'un encadreur/Superviseur terrain ;
- ✚ Les différentes distributions se feront in-situ pour la promotion des mesures de protection ;
- ✚ L'avancement des activités, les succès, les problèmes rencontrés, les urgences, l'intention de changement des tactiques et stratégies de mise en œuvre selon le besoin et tout autre question qui s'imposera au fil du temps sera partagé progressivement et à temps réel avec la FAO pour orientation, décantation, suggestion, solution et/ou prise de décision soit collective soit individuelle (réservée uniquement à la FAO). Ce qui nous permettra de prévenir plusieurs inefficacités dans l'atteinte des résultats du présent Projet.

### III. ACTIVITES REALISEES SELON LA PLANIFICATION

A l'égard des responsabilités assignées à la DPF au travers le protocole d'accord N°0146-2025, pendant ces premières phases de mise en œuvre du projet, d'une manière détaillée, les activités ci-après ont été réalisées :

**Activité 1 : Etablissement des critères de ciblage en étroite collaboration avec la FAO, le cluster sécurité alimentaire et les membres de communautés bénéficiaires**, dans le cadre de ce projet, 2 types des critères ont été défini pour faciliter la présélection et l'enregistrement des bénéficiaires, il s'agit notamment de :

#### I. Les critères généraux :

- Ménages retournés ;
- Ménage déplacé interne ;
- Famille d'accueil.

#### II. Critères spécifiques :

- Un chef de ménage ayant un handicap physique ;
- Femme chef de ménage ;
- Personne de troisième âge ayant des dépendants ;
- Ménage ayant des enfants atteints par la malnutrition ;
- Femme enceinte étant au troisième trimestre ;
- Femme allaitante d'un nourrisson de moins d'une année ;
- Un pygmée remplissant d'autres critères de vulnérabilité.

Notons qu'il a été convenu que les critères ci-haut permettront seulement de cibler au total 6450 ménages parmi lesquels 5400 seulement seront retenus sur base de critère de vulnérabilité en sécurité alimentaire, lesquels sont intégrés dans le formulaire d'enregistrement.

**Activité 2 : Sensibilisation des communautés bénéficiaires sur le projet et processus de ciblage.** après la session de définition des critères de sélection, en est suivi les séances de sensibilisation communautaire pour permettre aux différentes parties prenantes de comprendre la méthodologie et les modalités qui seront suivies dans l'activité de ciblage, sachant que la communauté avait adopté l'approche « **ciblage communautaire** » ; une assemblée avait été tenue en faveur des autorités et leaders communautaire mais aussi des sessions de

sensibilisation de masse avaient été animées au sein de la communauté dans les différentes entités touchées par le projet.




**Activité 3 : Assurer l'information, la sensibilisation et la mobilisation des communautés bénéficiaires sur le projet ainsi que sur les mécanismes de plainte en place** (ligne verte, boîtes à suggestion, ...) : A ce stade l'équipe de mise en œuvre du projet avait organisé des séances de sensibilisation de masse sur les activités de ciblage et les mécanismes de gestion des plaintes mis en place, la méthodologie de ciblage prédéfinie avec les différentes parties prenantes ;



**Activité 4 : Mise en place des comités de ciblage au sein de la communauté :** Lors de sessions consultatives des leaders communautaires ainsi que les autorités locales, il avait été jugé judicieux que dans les 23 Sites couverts par le projet, un comité local de ciblage sera mis en place et sera principalement constitué par les cadres de base (chefs notables et les dix maisons), ces cadres de base serviront des guides aux enquêteurs et s'assurons que les ménages enregistrés sont ceux qui répondent aux critères mis en place.

**Activité 5 : Collecte et enregistrement de données (qualitative et quantitatives) de ménages identifiés, répondant aux critères de vulnérabilité, en étroite collaboration avec les cellules d'animation communautaire :** pour la mise en œuvre effective de cette activité, la FAO avait procédé tout d'abord par la formation des enquêteurs sur l'outil de collecte des données permettant de réunir toutes les informations nécessaires sur les ménages des déplacés et familles d'accueil. Ainsi le logiciel KoboCollect avait été utilisé.

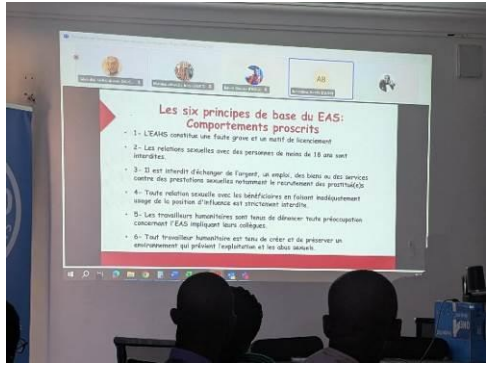

Après la formation, une équipe d'enquêteur avait été déployée sur terrain pendant une durée de 8 jours, laquelle qui a parcouru toute l'étendue de la zone ciblée en enregistrant les ménages remplissant les critères de sélection avec l'appui du comité de ciblage. Au total 3648 ménages avaient été enregistrés.



**Activité 6) Affichage des listes des bénéficiaires :** Après l'activité de ciblage et enregistrement des ménages, une liste provisoire des bénéficiaires avait été produite, laquelle était affichée dans les différents sites afin de permettre à la population d'apprécier et apporter ses points de vue par rapport aux premiers résultats de ciblage ; il s'en est suivie une session de collecte, analyse et traitement des plaintes laquelle a conduit à la production des listes définitives par la FAO ainsi que la note explicative du processus de ciblage. La note a été partagée avec le comité de ciblage à travers une assemblée communautaire. A cette même occasion DPF a remis aux bénéficiaires les jetons.



**Activite 7) Mise à jour de la base de données**

Au cours de la mise en œuvre des activités, certains ménages ont été élagués pour plusieurs raisons notamment les ménages qui ne sont plus dans la zone d'origine, les ménages ayant essayé de frauder en usurpant d'autres identités...mais aussi des cas de décès. Ce qui nous a conduit à demander le remplacement de ces bénéficiaires en termes de mise à jour de la base des données.

**Activité 8) Sensibilisation des ménages et préparation des sites de distribution des semences**

Des sessions de sensibilisation sur les activités du projet en général, et en particulier sur la distribution d'intrants agricoles, ont été organisées dans tous les sites ciblés par le projet. Au cours de ces sessions, il a été aussi question de voir avec les bénéficiaires quels sont les sites appropriés pour la distribution en misant prioritairement sur les aspects de protection.

Le message lié à la distribution portait principalement sur les organisations porteuses de ce projet, les dates (calendrier) de distribution, lieu de distribution, les modalités à remplir pour accéder à l'assistance, la composition des Kits à recevoir ainsi que son utilisation.





**Activité 9) Distribution de kit maraicher à 5400 ménages**

Dans le cadre de ce projet, la distribution d'intrants a été organisée dans les 2 territoires de Masisi au Nord-Kivu et territoire de Kalehe au Sud-Kivu, zone de santé de Kirotche (Aires de santé de Kihindo, Kimoka, Shasha où 3200 ménages) et zone de santé de Minova (Aire de santé de Kiniezire, Cheya, Nyamsasa, et Ruhunde où 2200 ménages) ont reçu un kit composé par les outils aratoires (2 Houes, 1 Bêche, 1 Râteau, 1 Arrosoir, 15 Sacs vides, 1 brouette par groupe de 20) et 40g semences maraichères (Amarantes, Choux, Aubergine, et Oignons).



Tableau 2 : Tableau de distribution des intrants aux ménages dans les zones de Santé de Kirotshe et Minova

N°	Village/Aires de santé	Unité	Quantité des outils distribués					Unité	Quantité de semences distribuées				
			Houe	Arrosoir	Râteau	Bêche	Brouette		Aubergine	Amarante	Oignon	Chou pomme	Epina rd
1	NYABIBALE	Pièce	502	251	251	251	13	Gramme	2510 <sup>9</sup>	2510	1300	2510	2510
2	NYAMUBINGWA	Pièce	994	497	497	497	24	Gramme	4970	4970	2400	4970	4970
3	MAOMA	Pièce	588	294	294	294	15	Gramme	2940	2940	1500	2940	2940
4	KITUVA	Pièce	546	273	273	273	14	Gramme	2730	2730	1400	2730	2730
5	SHASHA 2	Pièce	634	317	317	317	16	Gramme	3170	3170	1600	3170	3170
6	SHASHA 1	Pièce	636	318	318	318	16	Gramme	3180	3180	1600	3180	3180
7	KIROTSHE	Pièce	562	281	281	281	14	Gramme	2810	2810	1400	2810	2810
8	KITUMBILI	Pièce	430	215	215	215	11	Gramme	2150	2150	1100	2150	2150
9	LUTOBOGO	Pièce	294	147	147	147	7	Gramme	1470	1470	700	1470	1470
10	NDOLERO	Pièce	340	170	170	170	8	Gramme	1700	1700	800	1700	1700
11	KIMOKA CENTRE	Pièce	316	158	158	158	8	Gramme	1580	1580	800	1580	1580
12	KADUKI STADE	Pièce	279	279	279	279	14	Gramme	2790	2790	1400	2790	2790
<b>S/Total 1</b>			<b>6400</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>160</b>		<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>16000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>
13	CHEYA	Pièce	906	453	453	453	22	Gramme	4530	4530	0	4530	4530
14	KINYEZIRE	Pièce	318	159	159	159	8	Gramme	1590	1590	0	1590	1590
15	MAKENGERE	Pièce	164	82	82	82	4	Gramme	820	820	0	820	820



16	MUKWIJA	Pièce	594	297	297	297	15	Gramme	2970	2970	0	2970	2970
17	BUGARAMA	Pièce	78	39	39	39	2	Gramme	390	390	0	390	390
18	KAHANGA	Pièce	142	71	71	71	4	Gramme	710	710	0	710	710
19	MAKELELE	Pièce	468	234	234	234	12	Gramme	2340	2340	0	2340	2340
20	NYAMASASA	Pièce	658	329	329	329	16	Gramme	3290	3290	0	3290	3290
21	KIBIMBI	Pièce	584	292	292	292	14	Gramme	2920	2920	0	2920	2920
22	NYABWIMBA	Pièce	108	54	54	54	3	Gramme	540	540	0	540	540
23	RUHUNDE	Pièce	380	190	190	190	10	Gramme	1900	1900	0	1900	1900
<b>S/Total 2</b>			<b>4400</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>110</b>		<b>22000</b>	<b>22000</b>	<b>0</b>	<b>22000</b>	<b>22000</b>
<b>Total</b>			<b>10800</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>270</b>		<b>54000</b>	<b>54000</b>	<b>16000</b>	<b>54000</b>	<b>54000</b>



**Activité 10)** Renforcement des connaissances des bénéficiaires sur le maraichage en mettant l'accent sur le micro-jardinage et l'agriculture sensible à la nutrition :

Une session de renforcement des capacités en faveur de 36 chefs des ménages bénéficiaires du projet ont été formés pendant 3 jours sur les techniques de production agricole d'urgence sensible à une nutrition saine sous la facilitation d'un technicien de la FAO et de l'inspection territoriale de l'agriculture de Masisi. Dans cette session 4 points majeurs ont été développés : a) le rôle des cultures maraichères dans la nutrition ; b) les différentes cultures maraichères adaptées aux conditions adapho-climatique de Masisi, c) les techniques de production hors sol et les micro-jardinage sur plates-bandes ; d) la lutte biologique des ravageurs.



Toujours dans ce même cadre, des jardins communautaires ont été installés dans les différents villages touchés par le projet.



**Activité 11)** Suivi et encadrement technique des ménages bénéficiaires

Après la session de formation, s'en est suivi les sessions de restitutions pour permettre aux restes des bénéficiaires de mettre en places des jardins communautaires, et à chaque bénéficiaire de mettre chez lui un micro-jardin familial. Au-delà de ces sessions de restitution, les techniciens agronomes de la DPF (monétaires agricoles) ont acheminé avec l'encadrement technique et accompagnement rapproché des bénéficiaires.





**Activité 12) Collecte des données sur la production des ménages et son utilisation**

Actuellement dans le territoire de Masisi, Zone de santé de Kirotshe les cultures sont en pleine croissance, et les activités de suivi de la production sont en cours. Notons que pour cette activités nous avons mis en place un outil « formulaire » Kobocollect qui nous permettra e collecter les données de production et utilisation de la recolte. Cet outil nous permettra au final d’avoir une base des données générale relative à la production.



### Activité 13) Assurer la visibilité de la FAO sur terrain

Les ménages bénéficiaires sont conscients sur tout le plan que la FAO a fourni une aide pour booster leurs activités quotidiennes de champ, cela est connu même par les enfants, en voyant un des agents ils savent directement que c'est la FAO. Ceci étant l'une des objectifs de sensibilisation, les pancartes avec logo de la FAO sont installées dans les différents sites ciblés par le projet pour assurer cette visibilité sur terrain.

### Activité 14) Mise en place des comités communautaires de préparation aux urgences à Masisi et à Minova

Comme les communautés sont confrontées à de chocs multidimensionnels récurrent : conflits armés, déplacements forcés, aléas climatiques et épidémies. Ces crises compromettent gravement la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des ménages. Pour répondre à ces défis, et dans le cadre du projet TCP/RDC/4003, la FAO appuie la mise en place de Comités Communautaires de Préparation aux Urgences (CCPU), intégrés au sein de dispositifs communautaires d'alerte précoce dans les zones de santé de Kirotshé et Minova.



### Activité 15) Formation des agents collecteurs des données SAP

C'est toujours dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, que la FAO a pris l'initiative de former les agents qui pourront s'impliquer dans la collecte, l'objectif était de faire comprendre l'outil de collecte à ces derniers et avoir certaines orientations techniques. L'échantillon tiré est de 172 ménages pour la zone de santé de Masisi.



**Tableau 3 : Synthèse des types d'enquêtes, unités d'échantillons et fréquence de collecte**

Type d'enquête	Unités échantillon	Cycle de collecte des données	Nbre de tours par mois	Calendrier mensuel			
				S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>
Production agricole	Ménage	Trimestrielle	1				
Disponibilité alimentaire	Ménage	Mensuelle	1				
Accès économique	Ménage	Mensuelle	1				
Marchés	Marché	Bi-hebdomadaire*	2				
Nutrition	Ménage	Mensuelle	1				
Climat	Village	Hebdomadaire	4				
Moyens d'existence	Ménage	Mensuelle	1				
Risques et aléas	Village	Hebdomadaire	4				

*En cas de fluctuations brusques sur le marché (prix, disponibilité, accès), les données doivent être collectées immédiatement, même si la période prévue n'est pas encore atteinte. Un ajustement sera effectué en tenant compte du prochain cycle de collecte habituel.*

**Tableau 4 : Prévion de l'échantillon de collecte des données par province**

Province	Aire de santé	BENEF	Sites/villages	Echantillon Prevue	TOT AS	Marché ciblé	COMM./marché
Nord-Kivu	BWEREMANA	1,000	NYAMUBINGWA	18	54	BWEREMANA	1
			NYABIBALE	18		MINOVA	1
			MAOMA	18			
	SHASHA_1	900	KITUVA	16	48	SHASHA	1
			SHASHA_1	16			
			SHASHA_2	16			
	KILOTSHE	550	KILOTSHE	15	30		
			KITUMBULI	15			
	SAKE	750	LUTOBOGO	10	40	SAKE	2
			KADUKI	10			
KIMOKA			10				
NDOLERO			10				
<b>ENSEMBLE N-K</b>		<b>3200</b>		<b>172</b>	<b>172</b>		
Sud-Kivu	CHEYA	453	CHEYA	16	16	CHEYA & MINOVA	2
	KINIEZIRE	159	KINYENZIRE	10	31		
		82	MAKENGERE	5			
		297	MUKWIJA	16			
	NYAMASASA	39	BUGARAMA	5	61		
		71	KAHANGA	5			
		234	MAKELELE	14			
		329	NYAMASASA	16			
		292	KIBIMBI	16			
	54	NYABWIMBA	5				
RUHUNDE	190	RUHUNDE	10	10			
<b>ENSEMBLE S-K</b>		<b>2200</b>		<b>118</b>	<b>118</b>		

*Ce tableau représente la prévion par échantillon des données SAP à collecter dans les deux zones de santé couvertes par le projet dont la taille de l'échantillon s'élève à 172 ménages au Nord-Kivu et 118 ménages au Sud-Kivu.*

**Activité 16) Collecte des données SAP dans la zone de santé de Kirotshe et Minova**

Pendant une durée de 4 mois consécutifs, les données SAP ont été collectées dans les 2 entités ciblées par le projet selon les fréquences ci-haut présentées, dans l'objectif de surveiller les



indicateurs clés liés à l’agriculture, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et aux moyens d’existence ; d’analyser les risques et vulnérabilités ; de générer des alertes précoces fiables ; d’appuyer la planification et les réponses rapides ; et de renforcer la résilience des communautés les plus exposées dans ce contexte de l’Est de la RDC qui est complexe et instable.

Au total 6 missions de collecte des données ont été organisées, lesquelles ont été appuyé par les données collectées auprès de personnes ressources membres des CCPU mis en place par la FAO dans chaque province.



### Activité 17) Les suivis des activités sur terrains avec la FAO

Par son chef de projet, la FAO a effectué plusieurs missions sur terrain, que soit circonstancielle ou pas ; on peut les évaluer à plus de 5 missions depuis la mise en œuvre des activités du projet. Cette présence sur terrain faisait état d’espoir aux bénéficiaires en besoin d’accompagnement ; et le renforcement de leur niveau d’implication dans les activités du projet.



## IV. RESULTATS ET IMPACT DU PROJET

### IV.1. Résultats

D'une manière synthétique, voici le tableau des résultats coupés aux indicateurs :

Résultat attendu	Indicateur	cible	Résultats atteints	Ecart	Commentaire
5400 ménages sont ciblés et enregistrés ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre des ménages identifiés et enregistrés</li> <li>• 1 base de données partagée ;</li> <li>• Un mécanisme des plaintes installé ;</li> <li>• Les Procès-verbaux de mise en place des comités de plaintes partagés, avec la liste nominative et signée des membres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6450 ménages identifiés et enregistrés</li> <li>• 1 base de données partagée ;</li> <li>• Un mécanisme de gestion des plaintes est mis en place ;</li> <li>• Un Procès-verbal de validation des critères de sélection et mise en place des comités de ciblage est produit et signé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 5400 ménages ont été présélectionnés comme bénéficiaires du projet dans le territoire de Masisi, Zone de santé de Kirotshe et dans le territoire de Kalehe, Zone de santé de Minova ;</li> <li>✓ Une base des données a été partagée à travers la synchronisation des données enregistrées dans KoboCollect ;</li> <li>✓ 3 Canaux de signalement des plaintes et suggestions ont été communiqués à la communauté dans les sessions de sensibilisation,</li> <li>✓ Un Procès-verbal avait été signé par la communauté</li> </ul>	Aucun	Lors de l'activité de ciblage des bénéficiaires dans le site de shasha au Nord-Kivu, les premières données avaient été annulées car certaines autorités locales avaient influencé négativement la collecte, en faisant enregistrer les ménages ne remplissant pas les critères. Mêmes à Cheya au Sud-Kivu où 50 données ont été annulées.
5400 ménages retournés reçoivent les intrants agricoles et bénéficient d'un accompagnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre des ménages ayant reçu les intrants agricoles à travers le projet ;</li> <li>• Nombres des bénéficiaires accompagnés par les</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5400 ménages reçoivent les kits d'intrants agricoles dont 3200 au Nord-Kivu et 2200 au Sud-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 5400 ménages ont reçu les kits d'intrants agricoles dont les outils aratoires (2 Houes, 1 Bêche, 1 Râteau, 1 Arrosoir, 15 Sacs vides, 1 brouette par</li> </ul>	Aucun	



technique de proximité	techniciens du projet	<p>Kivu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5400 bénéficiaires sont encadrés et accompagnés dans l'aire de santé de cheya, Kiniezire, Nyamasasa, Ruhunde, Mukwija, Kihindo, Shasha, et Kimoka</li> </ul>	<p>groupe de 20) et 40g semences maraichères (Amarantes, Choux, Aubergine et épinard), ainsi que 100g d'Oignons par groupe de 20).</p> <p>✓ 5400 ménages sont encadrés et accompagnés par les moniteurs agricoles de la DPF à Masisi au Nord-Kivu</p>		
Les données sur la sécurité alimentaire dans la zone de santé de Minova, en territoire de Kalehe, province de Sud-Kivu sont collectées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre des ménages ssions de collecte des données organisées</li> </ul>	<p>290 ménages bénéficiaires représentent la taille de l'échantillon dont 172 à Masisi et 118 à Kalehe</p>	<p>✓ 6 missions de collecte des données ont été réalisées dans les 2 entités ciblées par le projet</p>	Aucun	



## **IV.2. Impact**

Globalement en se référant à l'objectif global de ce projet, un impact positif se fait voir sur terrain, et cela sur plusieurs aspects de la vie des bénéficiaires :

### **a) La vie sociale :**

Grâce à ce projet, 5400 ménages désagrégés par sexe et par village, ont amélioré la vie sociale à travers le renforcement de la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages. Ont réduit la dépendance aux outils agricoles (houes, râteliers, bêches, arrosoirs) et ont amélioré la cohabitation pacifique à travers l'approche de groupements paysans et à travers les outils à usage communautaire (semences d'oignon, brouettes, champs...)

### **b) La vie économique**

Ce projet étant en grande partie focalisé sur l'amélioration des conditions de vie de la population, et réduction de la vulnérabilité à travers le secteur agricole, qui est la principale source des revenus et tout autre moyen de subsistance pour 90% des ménages dans la zone touchée par ce projet.

Ce projet a marqué son importance sur la vie quotidienne des 5400 ménages, car grâce à lui ces ménages ont reçu des intrants agricoles et outils aratoires, ce qui a permis à ces ménages de rehausser leur capacité économique à travers l'accès à la nourriture (les légumes diversifiés) et avec cette assistance certains des bénéficiaires ont eu la possibilité de relancer les activités agricoles et de produire eux seuls les semences (amarantes et épinards).

### **c) La culture**

Ce projet a impacté positivement sur la vie culturelle de la population dans les zones ciblées par le projet, par le fait de moderniser les pratiques culturelles tout en protégeant la santé de l'environnement (semis en sac, permaculture, fabrication de biopesticide, etc.).

## V. DEFIS ET MESURES DE MITIGATION

Au cours de cette phase de mise en œuvre du projet, nous nous sommes heurtés à quelques difficultés d'ordre administratif et technique, parmi lesquelles les plus pertinentes ont été les suivantes :

19

N°	DIFFICULTÉS	MESURES DE MITIGATION
1	Volume accru des besoins d'assistance humanitaire dans la zone comparativement au paquet disponible très limité dans le cadre de ce projet a suscité trop de lamentations et au niveau de la communauté et au niveau des autorités locales malgré les séances de sensibilisation.	Un accent particulier a été mis sur les critères de vulnérabilité qui permettront de cibler les vraies personnes remplissant les critères parmi les milliers des personnes en besoin. Mais aussi, l'équipe a renforcé les sensibilisations avec l'appui de la FAO pour que le projet ne puisse pas engendrer des conflits dans la communauté, mais plutôt soulager tant soit peu la souffrance des ménages en situation de vulnérabilité aigüe.
2	Retards de distribution des intrants et outils aratoires par rapport à la période prévue	Planifier à l'avance la logistique pour éviter les retards ainsi que l'équipe a renforcé les sensibilisations et créé une stratégie de rapprochement avec les bénéficiaires du projet
3	La quantité de semences d'amarante était insuffisante par rapport aux besoins ressentis	Nous avons accompagné les bénéficiaires dans la valorisation de multiplication de semences en laissant quelques pieds d'amarante pendant la récolte.
4	Les semences d'aubergine et oignons ne se sont pas adaptés dans la zone. Par observation directe, La levée avec un taux germinatif de 30% à dans plusieurs sites ciblés par le projet	Nous avons recommandé à la FAO de remplacer ces spéculations par celles qui sont mieux adaptées telles que l'épinard ou soit reconduire les mêmes spéculations avec les semences n'ayant pas perdu le pouvoir germinatif



## ***VI. LECONS APPRISES.***

De toutes les difficultés rencontrées dans cette période de mise en œuvre, nous avons retenu de manière non exhaustive, les leçons suivantes :

- La bonne communication avec les autorités locales, les leaders communautaires et les bénéficiaires en amont et pendant la mise en œuvre du projet est un facteur déterminant pour l'appropriation du projet par les bénéficiaires dans les territoires de Masisi au Nord-Kivu et Kalehe au Sud-Kivu ;
- L'utilisation de la main d'œuvre locale couplée à une main d'œuvre externe est un atout pour un bon ciblage et un suivi rapproché des bénéficiaires ;
- Le respect du chronogramme des distributions a un impact grandiose sur la réputation des acteurs et l'acceptation du projet par la communauté ;
- La bonne planification en amont, le respect du plan de travail, le déploiement logistique efficace, la qualité du staff, l'utilisation de la main d'œuvre locale, la communication transparente et fluide entre la FAO et ses partenaires, le respect des délais de transmission des rapports et des paiements, la connaissance et l'application des mesures sécuritaires, sont les conditions sine qua non de réussite d'un projet dans la zone d'exécution.



## VII. CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, nous pouvons conclure sans doute que le projet a déjà atteint en moyenne 95% des résultats attendus avec des indicateurs palpables dans toutes les zones d'intervention sous responsabilité de la DPF :

Pour le premier produit portant sur l'identification des bénéficiaires, 5400 ménages ont été ciblés et enregistrés, et les données base line ont été collectées ; ceci traduit un niveau de réalisation de 100%

Pour le deuxième produit lié à la distribution d'intrant agricole, 4500 Kits ont été distribués, composé chacun par 40gr de semences, 2 houes, 1 arrosoir, 1 râteau, et 1 bêche en faveur des 5400 bénéficiaires parmi lesquels les ménages retournés, déplacés et familles hôtes, mais aussi ces ménages bénéficient jusqu'à présent d'un accompagnement technique de proximité ; résultat déjà atteint à 95% étant donné que les activités de production et de récolte sont toujours en cours pour certains ménages bénéficiaires et certaines spéculations ;

Pour le troisième produit qui est celle de collecte des données SAP, le résultat atteint peut aller jusqu'à 95%, avec 6 missions réalisées au cours de la mise en œuvre.

Sur ce, il est recommandé à la FAO et tout autre acteur humanitaire intervenant dans le secteur de sécurité alimentaire d'initier des projets complémentaires en sécurité alimentaire pouvant permettre aux ménages ayant acquis des nouvelles connaissances pratiques en agriculture d'accéder à plus des moyens pour migrer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture de rente, jouant un rôle économique crucial mais soulevant des défis socio-économiques (dépendance, utilisation des marchés) et environnementaux (monocultures, impact biodiversité).

Fait à Goma, le 26 Février 2026

**Pour la mise en œuvre du projet**

**IRENGE ZIRHUMANANA Fabrice**

**Chef du projet**

**Pour la gestion financière du projet**

**USHINDI KAPARALI Daniel**

**Comptable**

**Pour la DPF-ONG**

**KAYIRERE BITEGETSIMANA Thérèse**

**Coordonnatrice**



## VIII. ANNEXES

### Histoire de succès de Madame NAKACHE MWISHUKO Denise

22



***“...Je m’appelle NAKACHE MWISHUKO Denise, je suis bénéficiaire du projet de la FAO qui est exécuté par la DPF à Nyabibale ”.***

*Parmi tant des projets déjà exécutés dans notre village, depuis que je suis retournée, celui-ci est le seul projet dont mon ménage a été sélectionné comme bénéficiaire direct...*

*Etant une femme rurale dépendante de l’agriculture, j’ai bénéficié auprès de la FAO un kit nécessaire pour la relance agricole (semences, outils aratoires) qui m’a permis de mettre en place un jardin potager chez moi, et installer un champ maraicher à Kyabondo, un village voisin, ceci pour essayer de trouver une petite occupation génératrice des revenus pour le bien de ma famille.*

*Avec le souci de ne pas chômer dans la grande saison agricole, grâce à la formation que j’ai bénéficié à travers ce projet. Au-delà de manger des légumes à mon goût ; j’ai mis en place un champ de multiplication de semences d’amarantes, et j’ai économiser un peu d’argent pour acheter quelques mesures de semences de haricot.*

*Personnellement, j’atteste être la preuve vivante qu’une assistance de 50 gr de semence et quelques outils aratoires appropriés peut améliorer le moyen de subsistance d’un ménage*

*Merci infiniment à la FAO et à la DPF son partenaire*





Organisation des Nations Unies  
pour l'alimentation et l'agriculture



Dynamique  
Paysanne  
Féminine

## PROCES VERBAL DE VALIDATION DES CRITERES DE PRESELECTION ET MISE EN PLACE DU COMITE DE CIBLAGE DES BENEFICIAIRES DU PROJET TCP/DRC/4003

L'an deux mille vingt-cinq 25 jour du mois de Juin Dans le cadre  
du projet d'Appui d'urgence aux moyens de subsistance agricoles des ménages touchés par le  
conflit dans l'est de la RDC

Volet de Sensibilisation, Ciblage des bénéficiaires, Distribution d'intrants agricoles et  
encadrement technique de 3200 ménages vulnérables et collecte d'informations sur  
l'agriculture et la sécurité alimentaire dans la zone de santé de Kirotche, Province du Nord-  
Kivu « TCP/DRC/4003 ». Projet financé par l'Organisation des Nations Unies pour  
l'Alimentation et l'Agriculture « FAO », et exécuté par l'Organisation non gouvernementale  
de développement Dynamique Paysanne Féminine « DPF ».

Au cours d'une assemblée communautaire tenue à BWEREMANA dans la salle le GRAINIER  
à Nyabibale, en date du ..... 2025, il a été décidé que les critères  
suivants seront pris en compte pour la présélection des ménages bénéficiaires du projet :


- ❖ Statut du Ménage Déplacés internes, Retournés, Famille
- ❖ d'accueil, Déplacés en Famille d'accueil
- ❖ Chef de Ménage ayant un handicap Physique
- ❖ Personnes troisième âge ayant des dépendants
- ❖ Ménages ayant des enfants jusqu'à
- ❖ malnutrition déjà atteints,
- ❖ Femmes enceintes (3<sup>ème</sup> trimestre)
- ❖ Femmes allaitantes des enfants de moins d'un an
- ❖ Peuple autochtone


Ceci étant, pour la matérialisation de cette décision, les différentes parties ont jugé judicieux  
de faire un ciblage communautaire, en mettant en place un comité de ciblage spécifique dans  
chaque site, les membres de ces comités seront les principaux guides des enquêteurs et seront  
appuyés par l'autorité locale de chaque entité.

*(Handwritten signatures and stamps)*

Pour les différentes parties prenantes

N°	NOM COMPLET	STRUCTURE	FONCTION	CONTACT	SIGNATURE
1.	BAUMA BIHEMU Damien	CHEFFERIE BATHUNDE	SECRET- CHEFFERIE	0970957648	
2.	BALUNGENE BISHUBI	AJUDI ahl	Asst. coordo	0971944990	
3.	BUZIMABWIRA AUGUSTIN	NOTABLE	LUTOBOLO	0972857345	
4.	MWAGE - DESIRE	NOTABLE	MAOMA	0970795102	
5.	BAUMA-BAROKI	NOTABLE	nyamubingwa	0979590307	
6.	MAKAMBA MITECHA	A.P.F.	Nyabibale		
7.	MATASA Remond	CHEF DE CELLULE	CHEF DE CELLULE	097488- 1009	
8.	BAHATI LU HUNGA	CHEF DE VILHAGE	BE VILHAGE KIMOKA	0978510747	
9.	NGULU MUTEBWA	CHEF DE VILHAGE	BE VILHAGE KITUSA	09726566 71	
10.	BAHATI MUSTHAMBISA	NOTABILITE	NOTABLE	0984277754	
11.	ANZA SABUNI	NOTABILITE	CAPITA	0981259090	
12.	RIZIKI MIVENYA ALYO	ASSOCIATI ON	PRESIDENT	0985263793	
13.	SALONPONXAMTURANO	chef de village	KITUMBIRI	0980433866	
14.	AMINA LUANDA Florey	Sec d'AVENU	SHASHA I	0985733775	
15.	AZI SHABABIMANA JUST	Sec d'AVENU	SHASHA II	0984806354	
16.	CLAUDE KJAH	SHASHA	ITT	0971308467	
17.	BATAKOMERWA - KAMAIE	Nyamubingwa	President	0975449887	
18.	KAAAMBU-MERVEILLE	SAKE	MUNAMA MEMBER	0998658488	
19.	MAAMBI KAZIONA	KIHUNDO	IT	0979725362	
20.	MAAMBI MUBIRII	VILLAGE MATUTA/SAKE	CHEF DE VILLAGI	0970674733	
21.	THERESE Kayitire	DPF	Coordonnatrice	0847770594	
22.	Pascal MBULA MWINA	DPF	chef de projet	0971997790	



23.	IRENGE R. FABRICE	DPF	Air. Prog	0998186001	
24.					
25.					



Pour validation du PV



  
 SECAO/CHEFFERIE  
 BAHUNDE

